


## Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN2112 odbočka pro: obec Baštínov  
úsek od ÚS HB 4039

demontáž	vysvorkování, demontáž KZL TR Mírovka – st.č.12 (2 dny)
stavba	tažení KZL TR Mírovka – st.č.12 (3 dny)

Vypnutí V1309/1310 v rámci realizace stavby

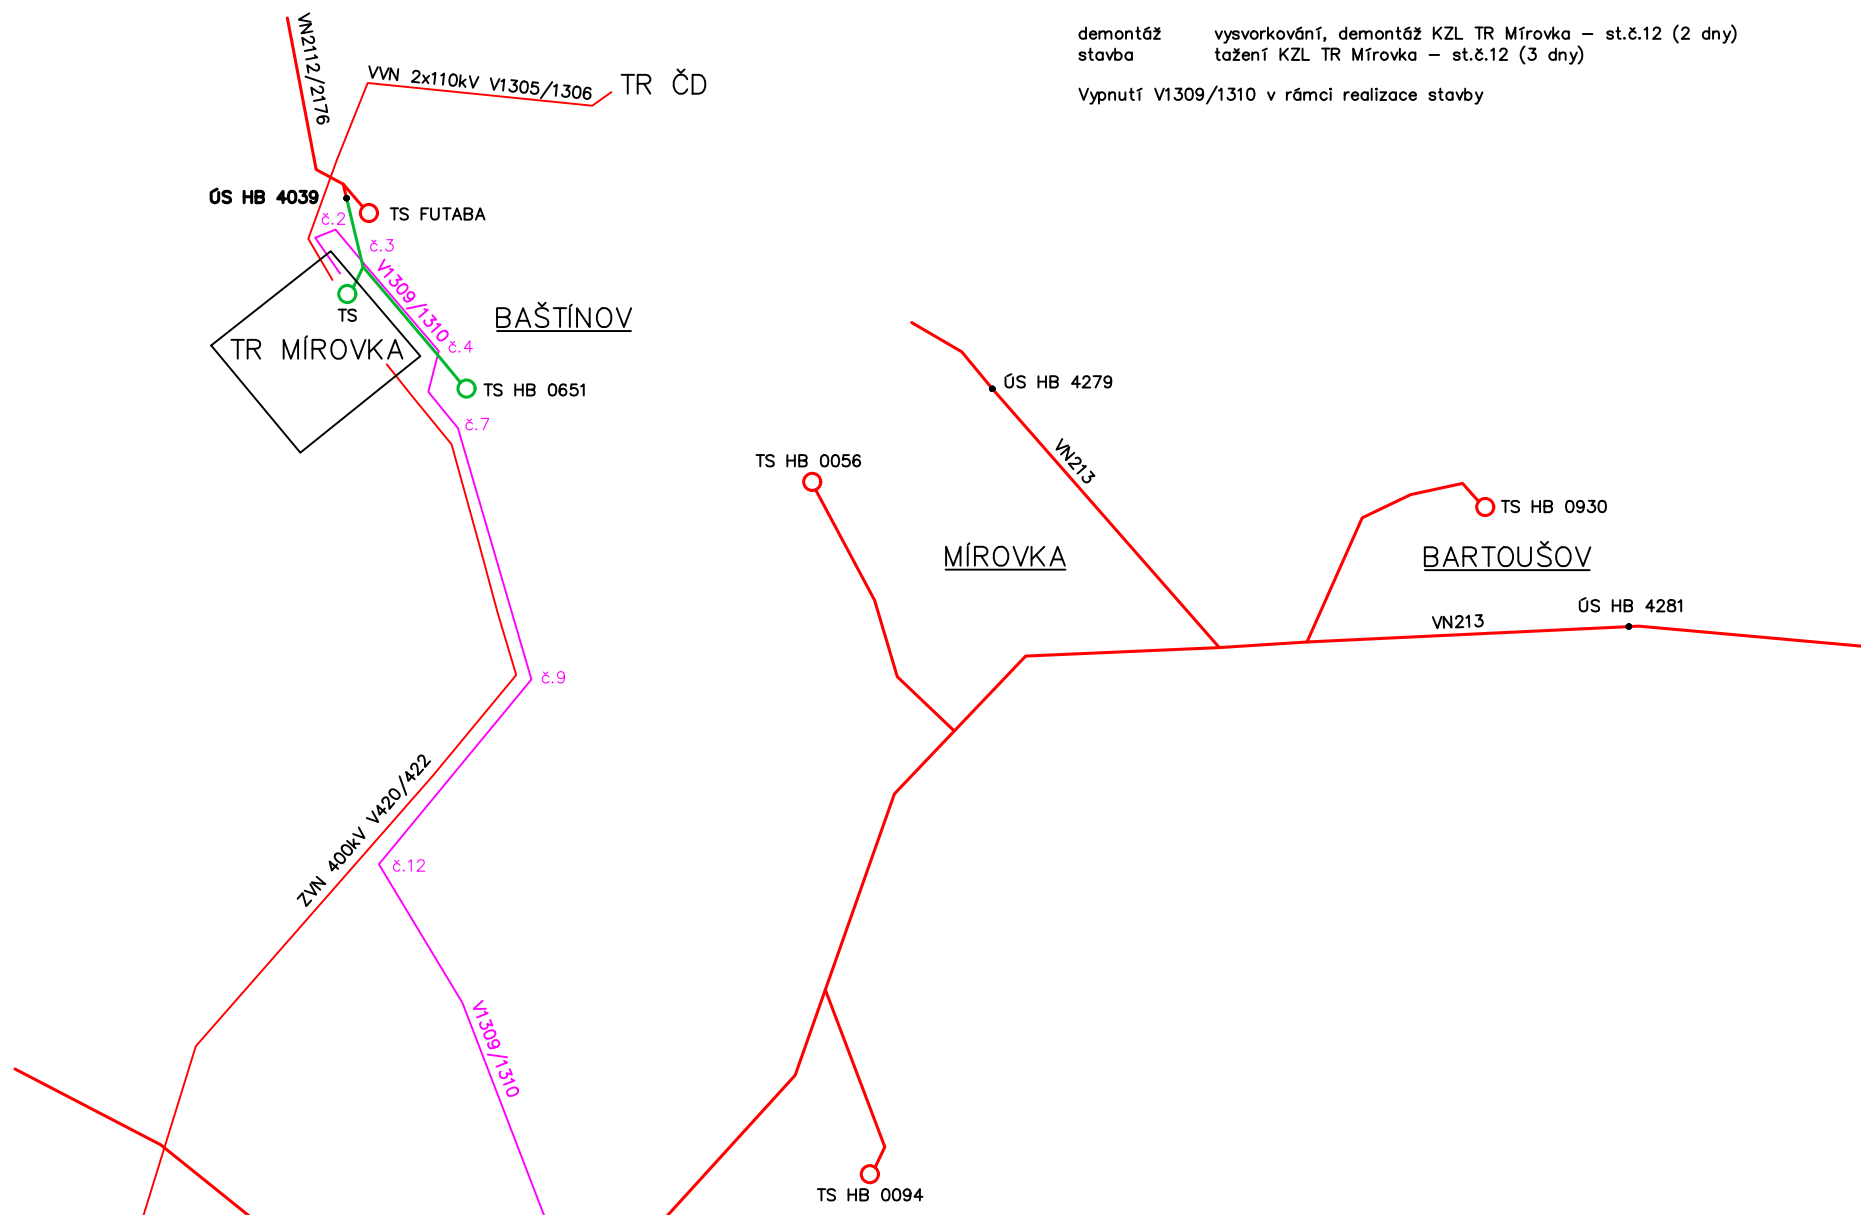


## Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN213 odbočka pro: obce Vysoká, Mírovka, Bartoušov  
 úsek mezi ÚS HB 4280 – ÚS HB 4279 – ÚS 4281

demontáž vysvorkování, demontáž KZL st.č.12 – st.č.24 (2 dny)  
 stavba tažení KZL st.č.12 – st.č.24 (3 dny)

Vypnutí V1309/1310 v rámci realizace stavby

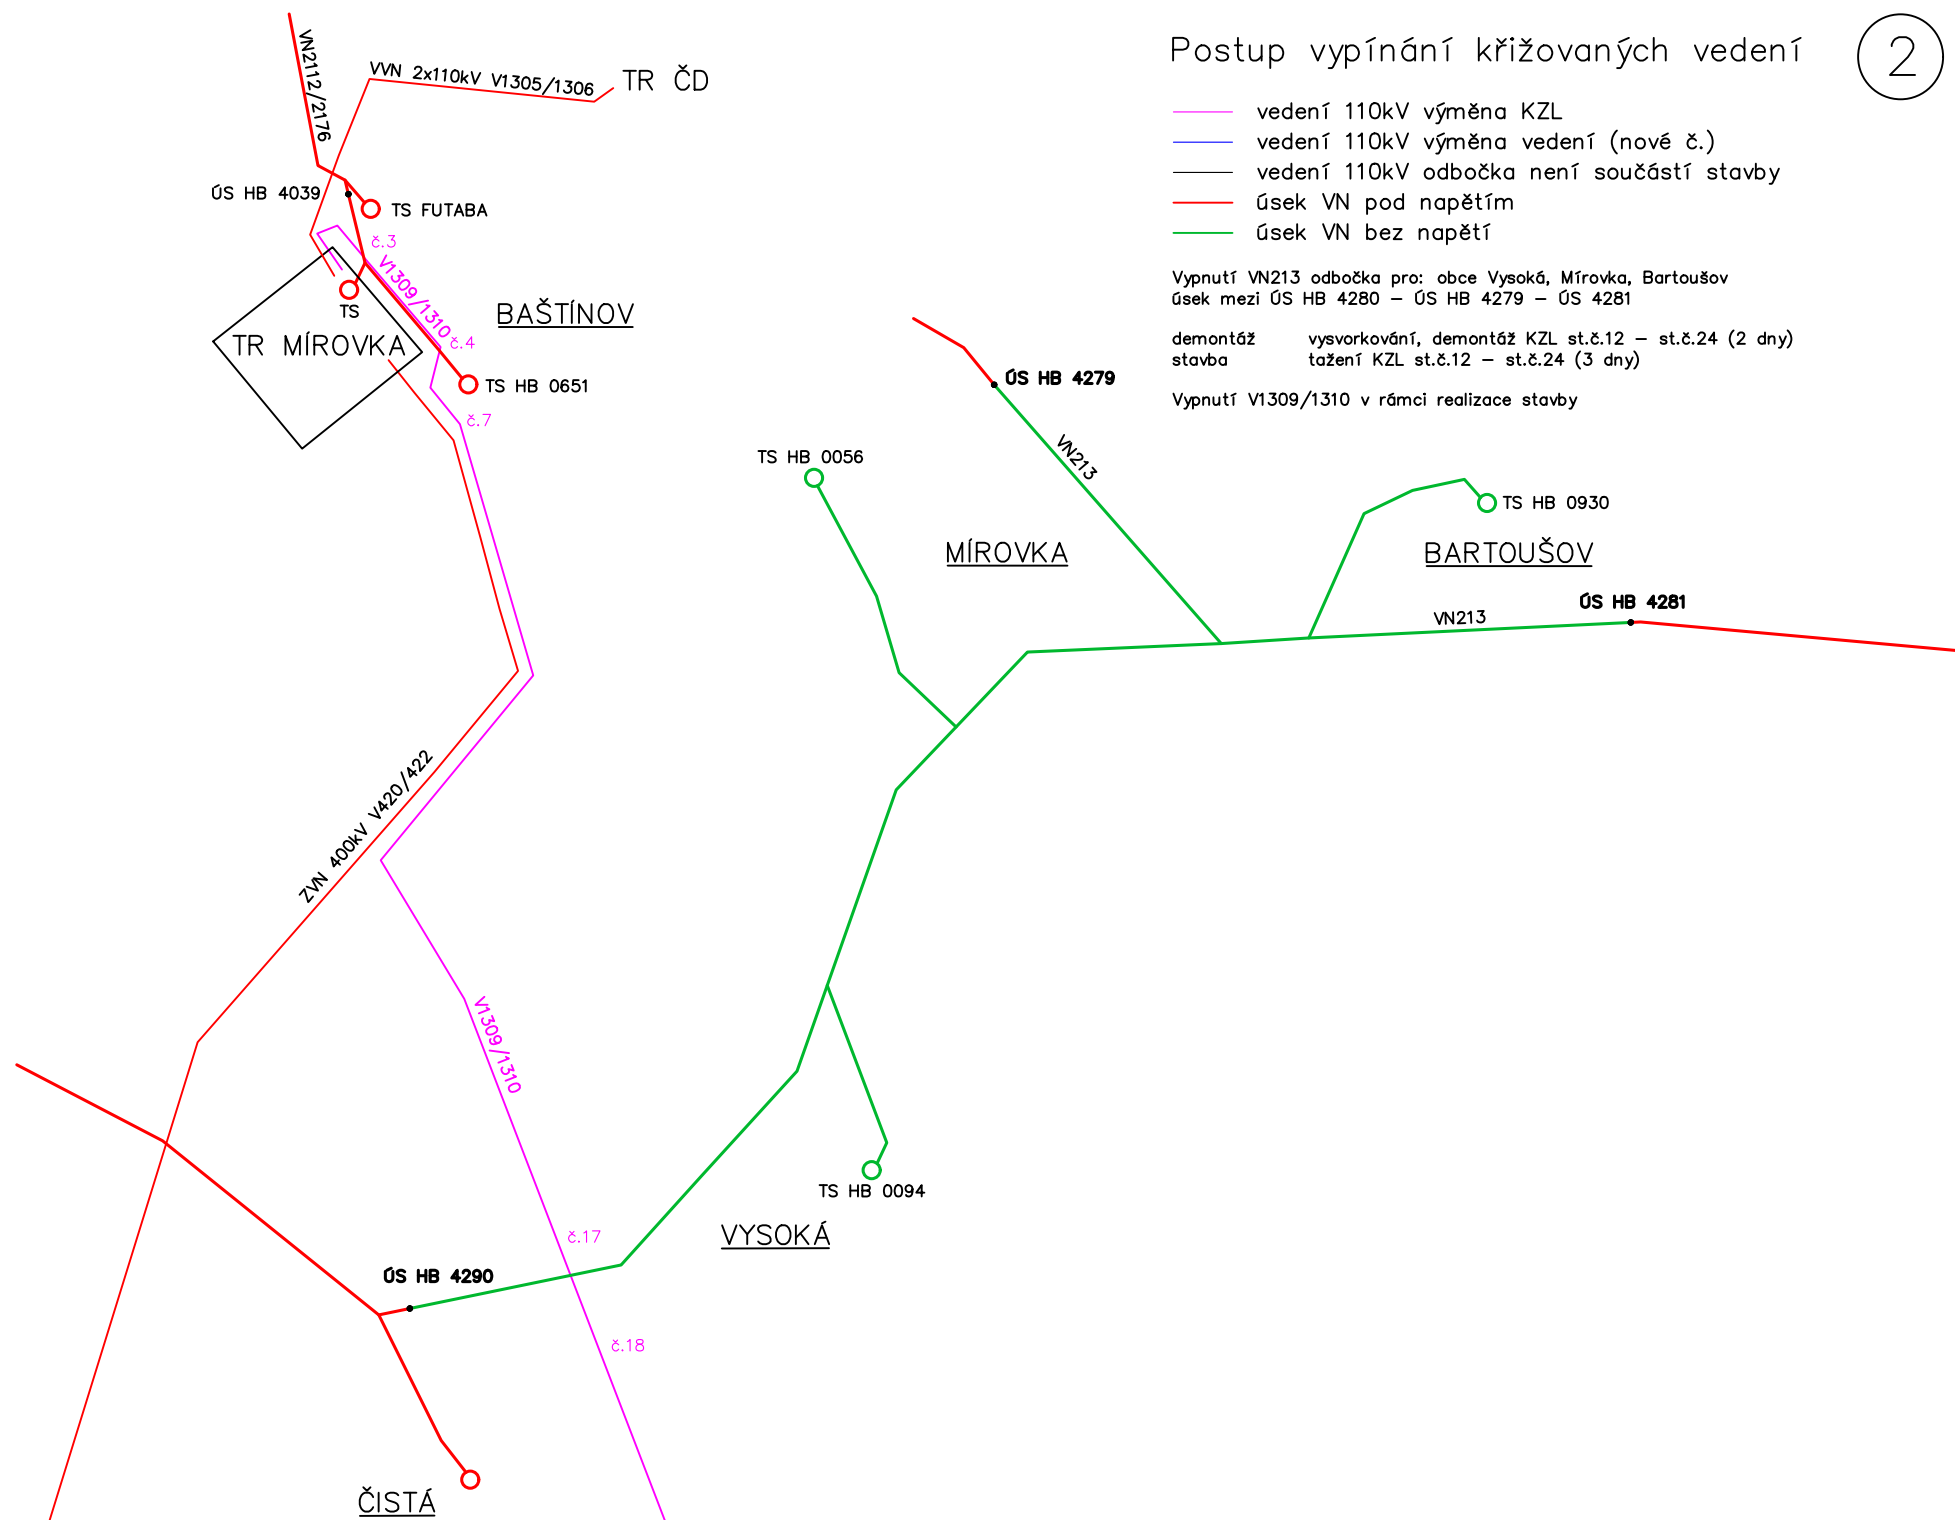

## Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN61 odbočka pro: obce Buková, Špinov, Nížkov  
úsek mezi ÚS HB 4050 – ÚS ZR 2348 – ÚS ZR 2708

demontáž	vodiče a KZL vedení st.č.80 – st.č.81 (1 den)
stavba	vodiče st.č.79 – st.č.83 (2 dny)
	KZL st.č.73 – st.č.98 (1 den)

OLEŠENKAŠPINOVBUKOVÁNÍŽKOVKOPANINA

VN61 (K

ÚS HB 4050

č.33  
ÚS ZR 2348  
TS 200082  
BUKOVÁ

TS 200892  
ŠPINOV

TS 201292  
U POTOKA

č.1  
ÚS ZR 2708

FRITAGRO

čov

č.1  
ÚS ZR 2714

č.79

č.80

č.22

č.23

č.81

č.83

V1310/1311

č.13

č.95

č.96

č.98

č.99

č.14


VN

## Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN61 odbočka pro: obce Kopaniny, Sázava  
úsek od ÚS ZR 2714

demontáž	vodiče a KZL vedení st.stáv.č.94 – st.stáv.č.95 (1 den)
stavba	vodiče st.č.92 – st.č.98 (2 dny)
	KZL st.č.73 – st.č.98 (1 den)

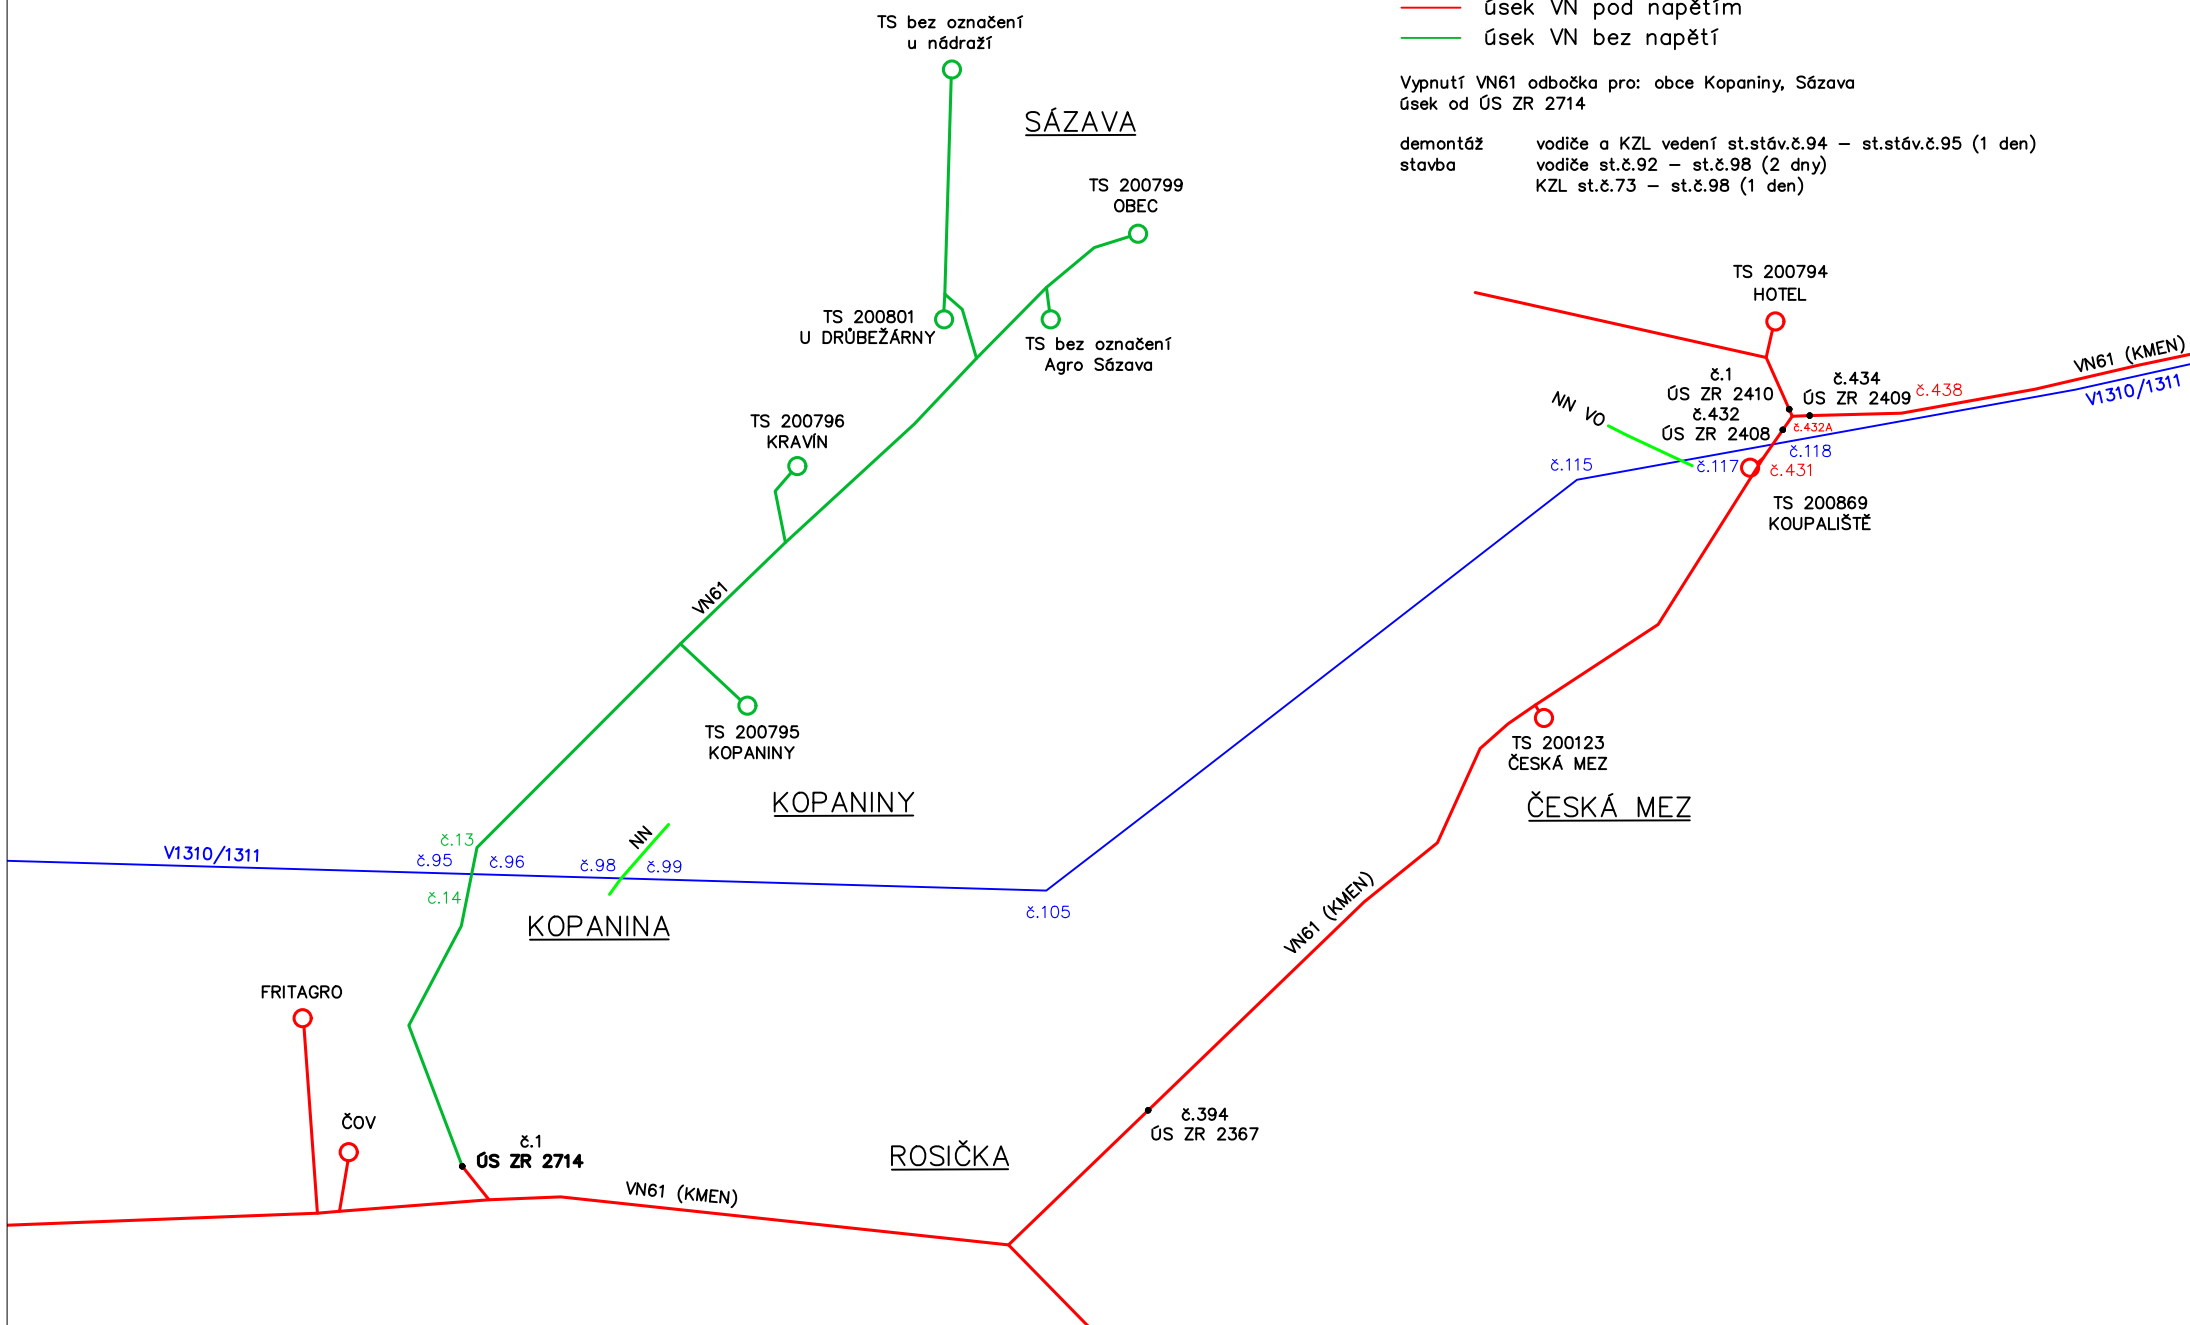


## Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN61 KMEN a obočky pro: obec Česká Mez, koupaliště  
 úsek mezi ÚS ZR 2367 – ÚS ZR 2408  
 Vypnutí NN

demontáž stavba vodiče a KZL st.stáv.č.109 – st.stáv.č.113 (1 den)  
 vodiče st.č.115 – st.č.122 (2 dny)  
 KZL st.č.115 – st.č.133 (1 den)

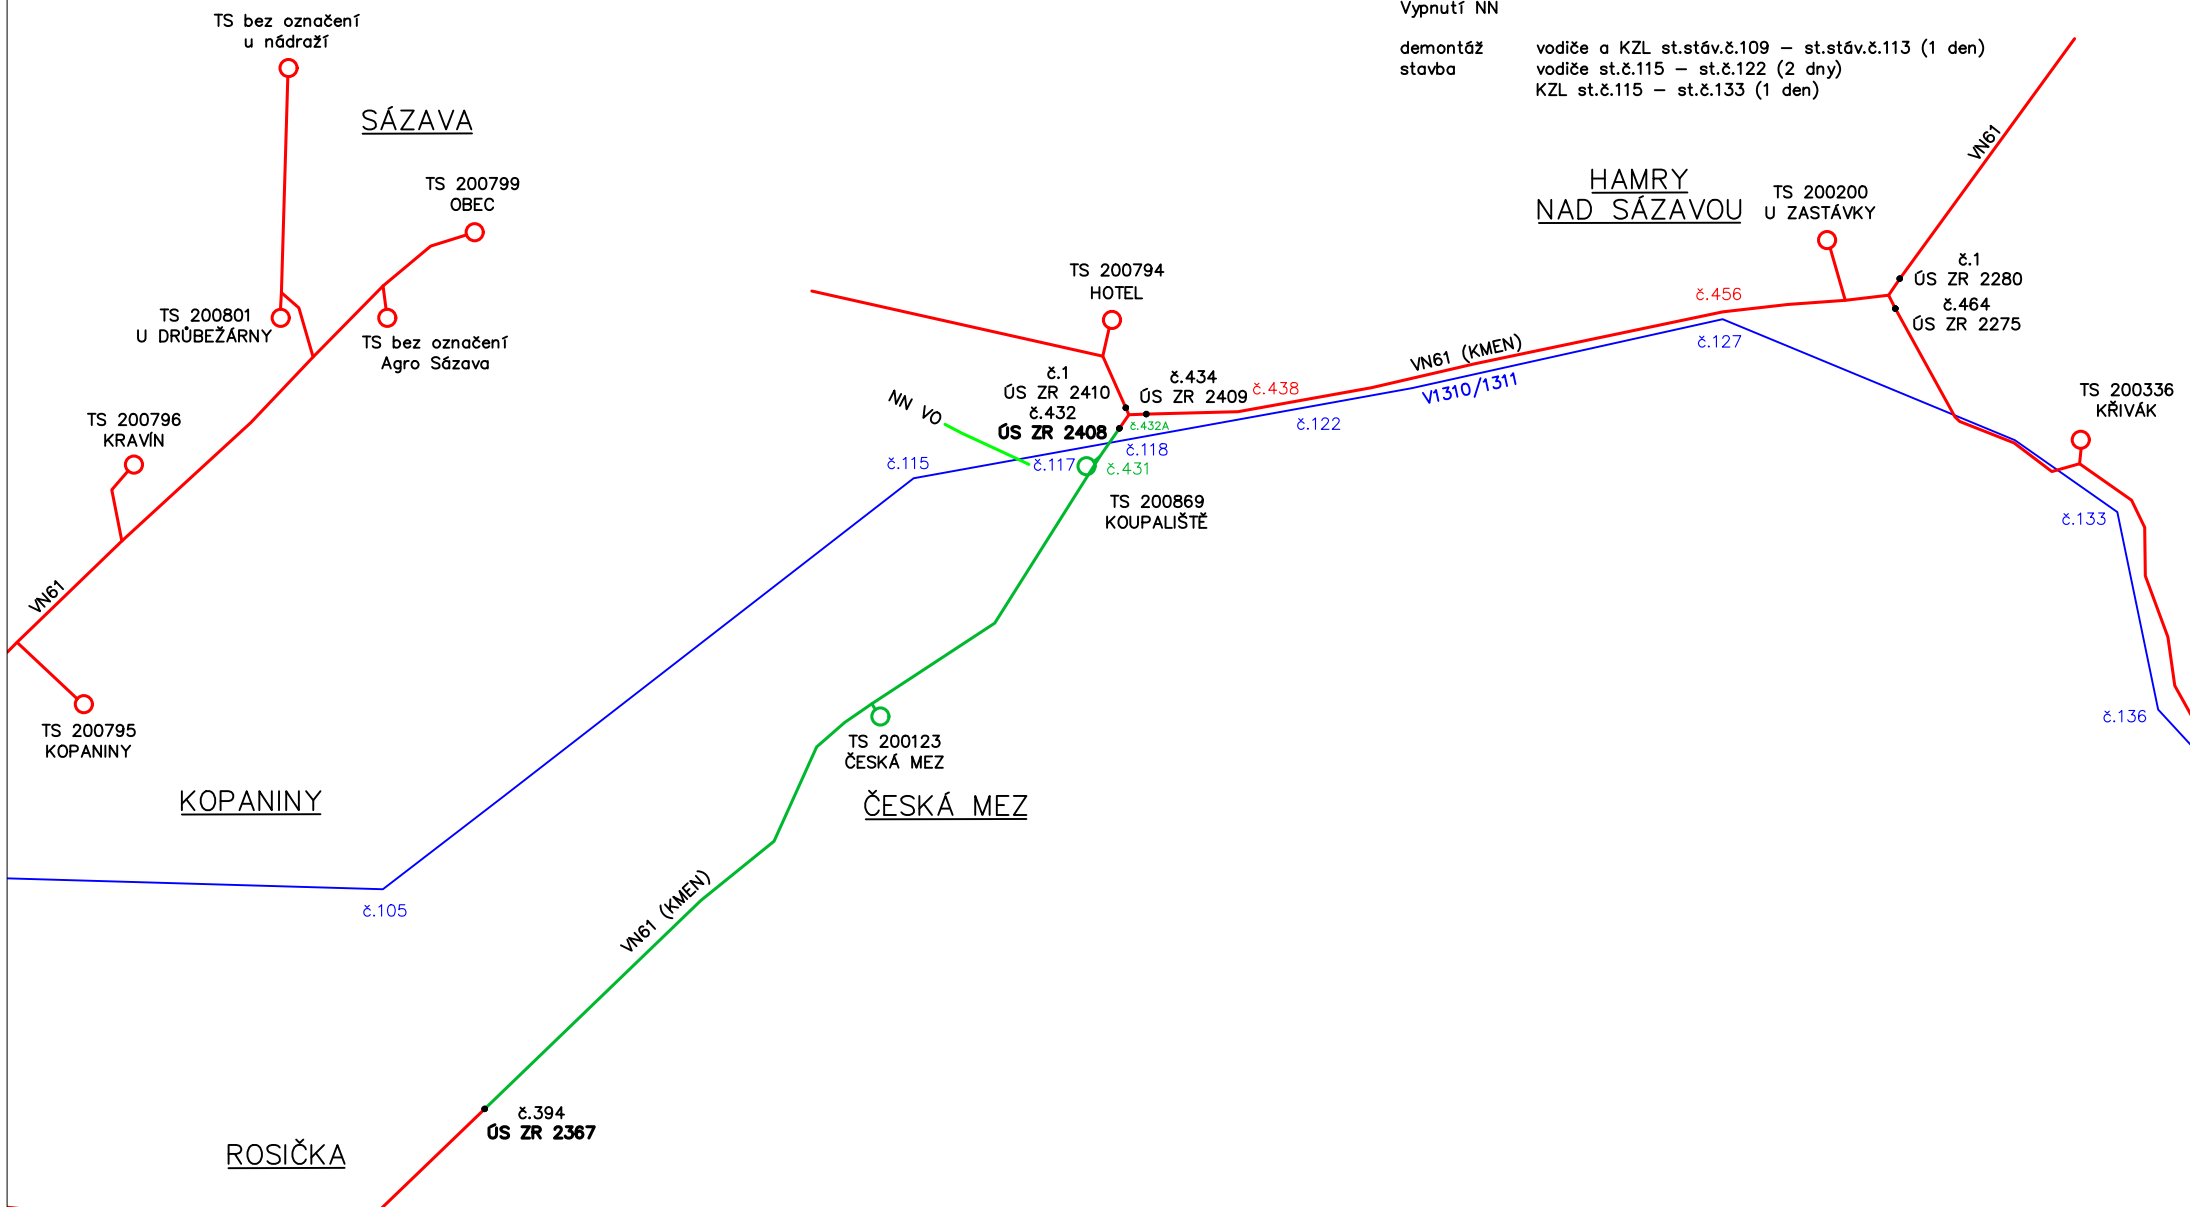

- Vypnutí VN61 KMEN a odbočky pro: obec Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou  
úsek mezi ÚS 2409 – ÚS ZR 2275 – ÚS ZR 2280

TS 201242  
TÁLSKÝ MLÝN

kabelový svod k T53  
bez označení

TS 201172  
STATEK DVŮR

VN61

TS 201244  
VODÁRNA ŽDAS

kabelový svod k TS 201215  
T42 TÁFERNA

kabelový svod k TS 700056  
T74 KLAFAR

ŽDÁR  
NAD SÁZAVOU

TS 201163  
IMPRESO

TS 201157  
ČOV

TS 201153  
AMYLON

TS 201261  
U MALÉHO LESA

TS 201265  
KOVO

TS 201169  
PRÁDELNA

TS 201168  
POČÍTAČ

TS 201155  
ROTANA

TS 201171  
SONA

TS 703054  
JIRKOV

MOŽNOST NAPÁJENÍ


# Postup vypínání křižovaných vedení

6b

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN61 KMEN a odbočky pro: obec Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou  
úsek mezi ÚS 2409 – ÚS ZR 2275 – ÚS ZR 2280

demontáž stavba      stožáry stáv.č.113 – č.119 (2 dny dle potřeby)  
stožáry č.119 – č.127 (3 dny dle potřeby)

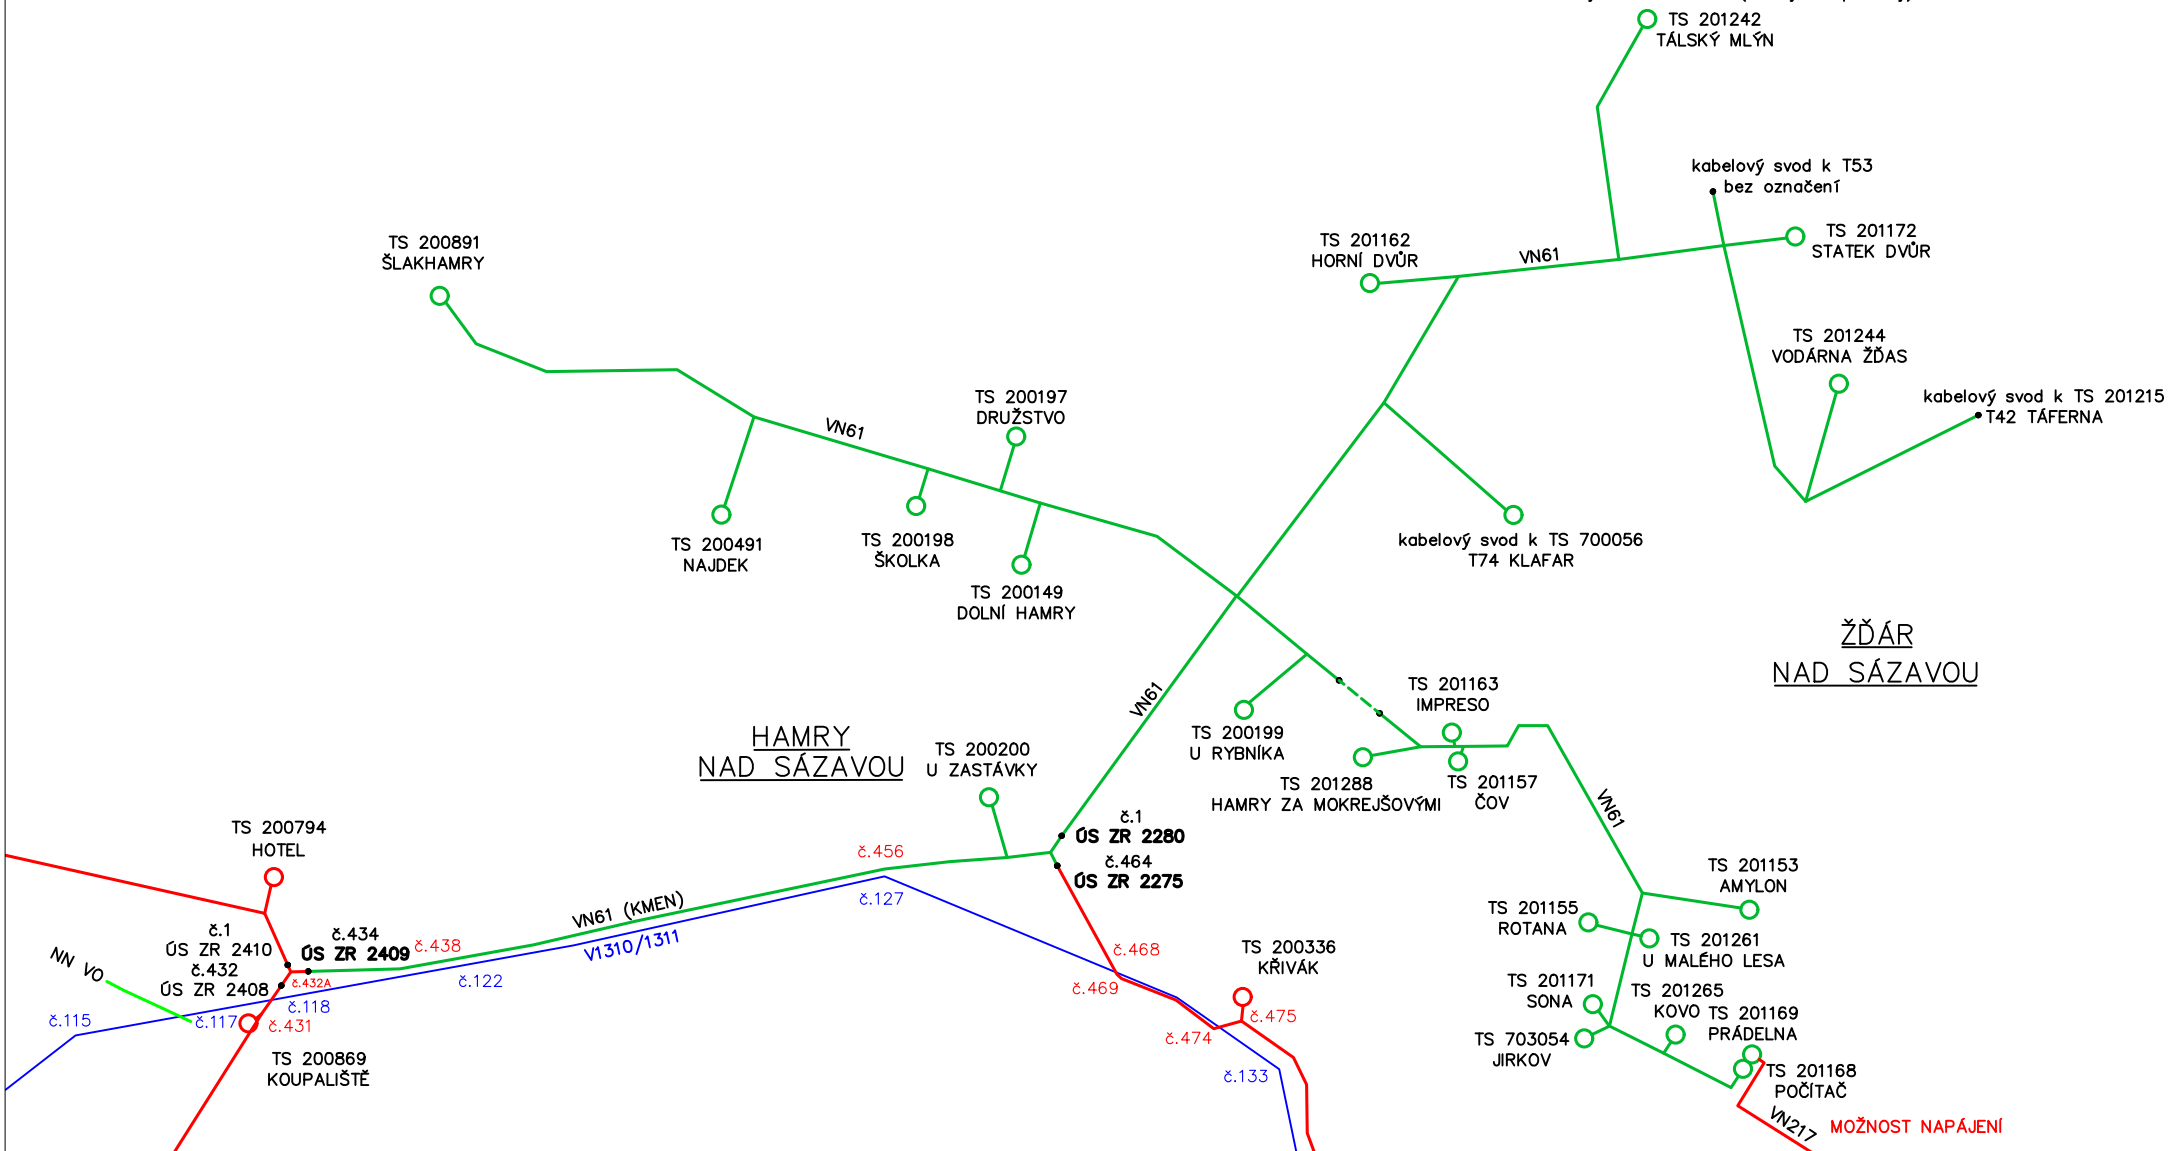


# Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN61 KMEN a odbočky pro: chatová oblast Hamry nad Sázavou, ZD areál  
úsek mezi ÚS ZR 2275 – ÚS ZR 2309 – ÚS ZR 2307

demontáž vodiče a KZL st.stáv.č.122 – 123, st.stáv.č.123 – 124 (1 den)  
stožár stáv.č.122, 124 (1 den)  
stavba stožár č.130, č.132 (1 den)  
vodiče st.č.127 – st.č.131, st.č.131 – st.č.133 (2 dny)  
KZL st.č.115 – st.č.136 (1 den)

Vypnutí V1311 podle postupu realizace stavby

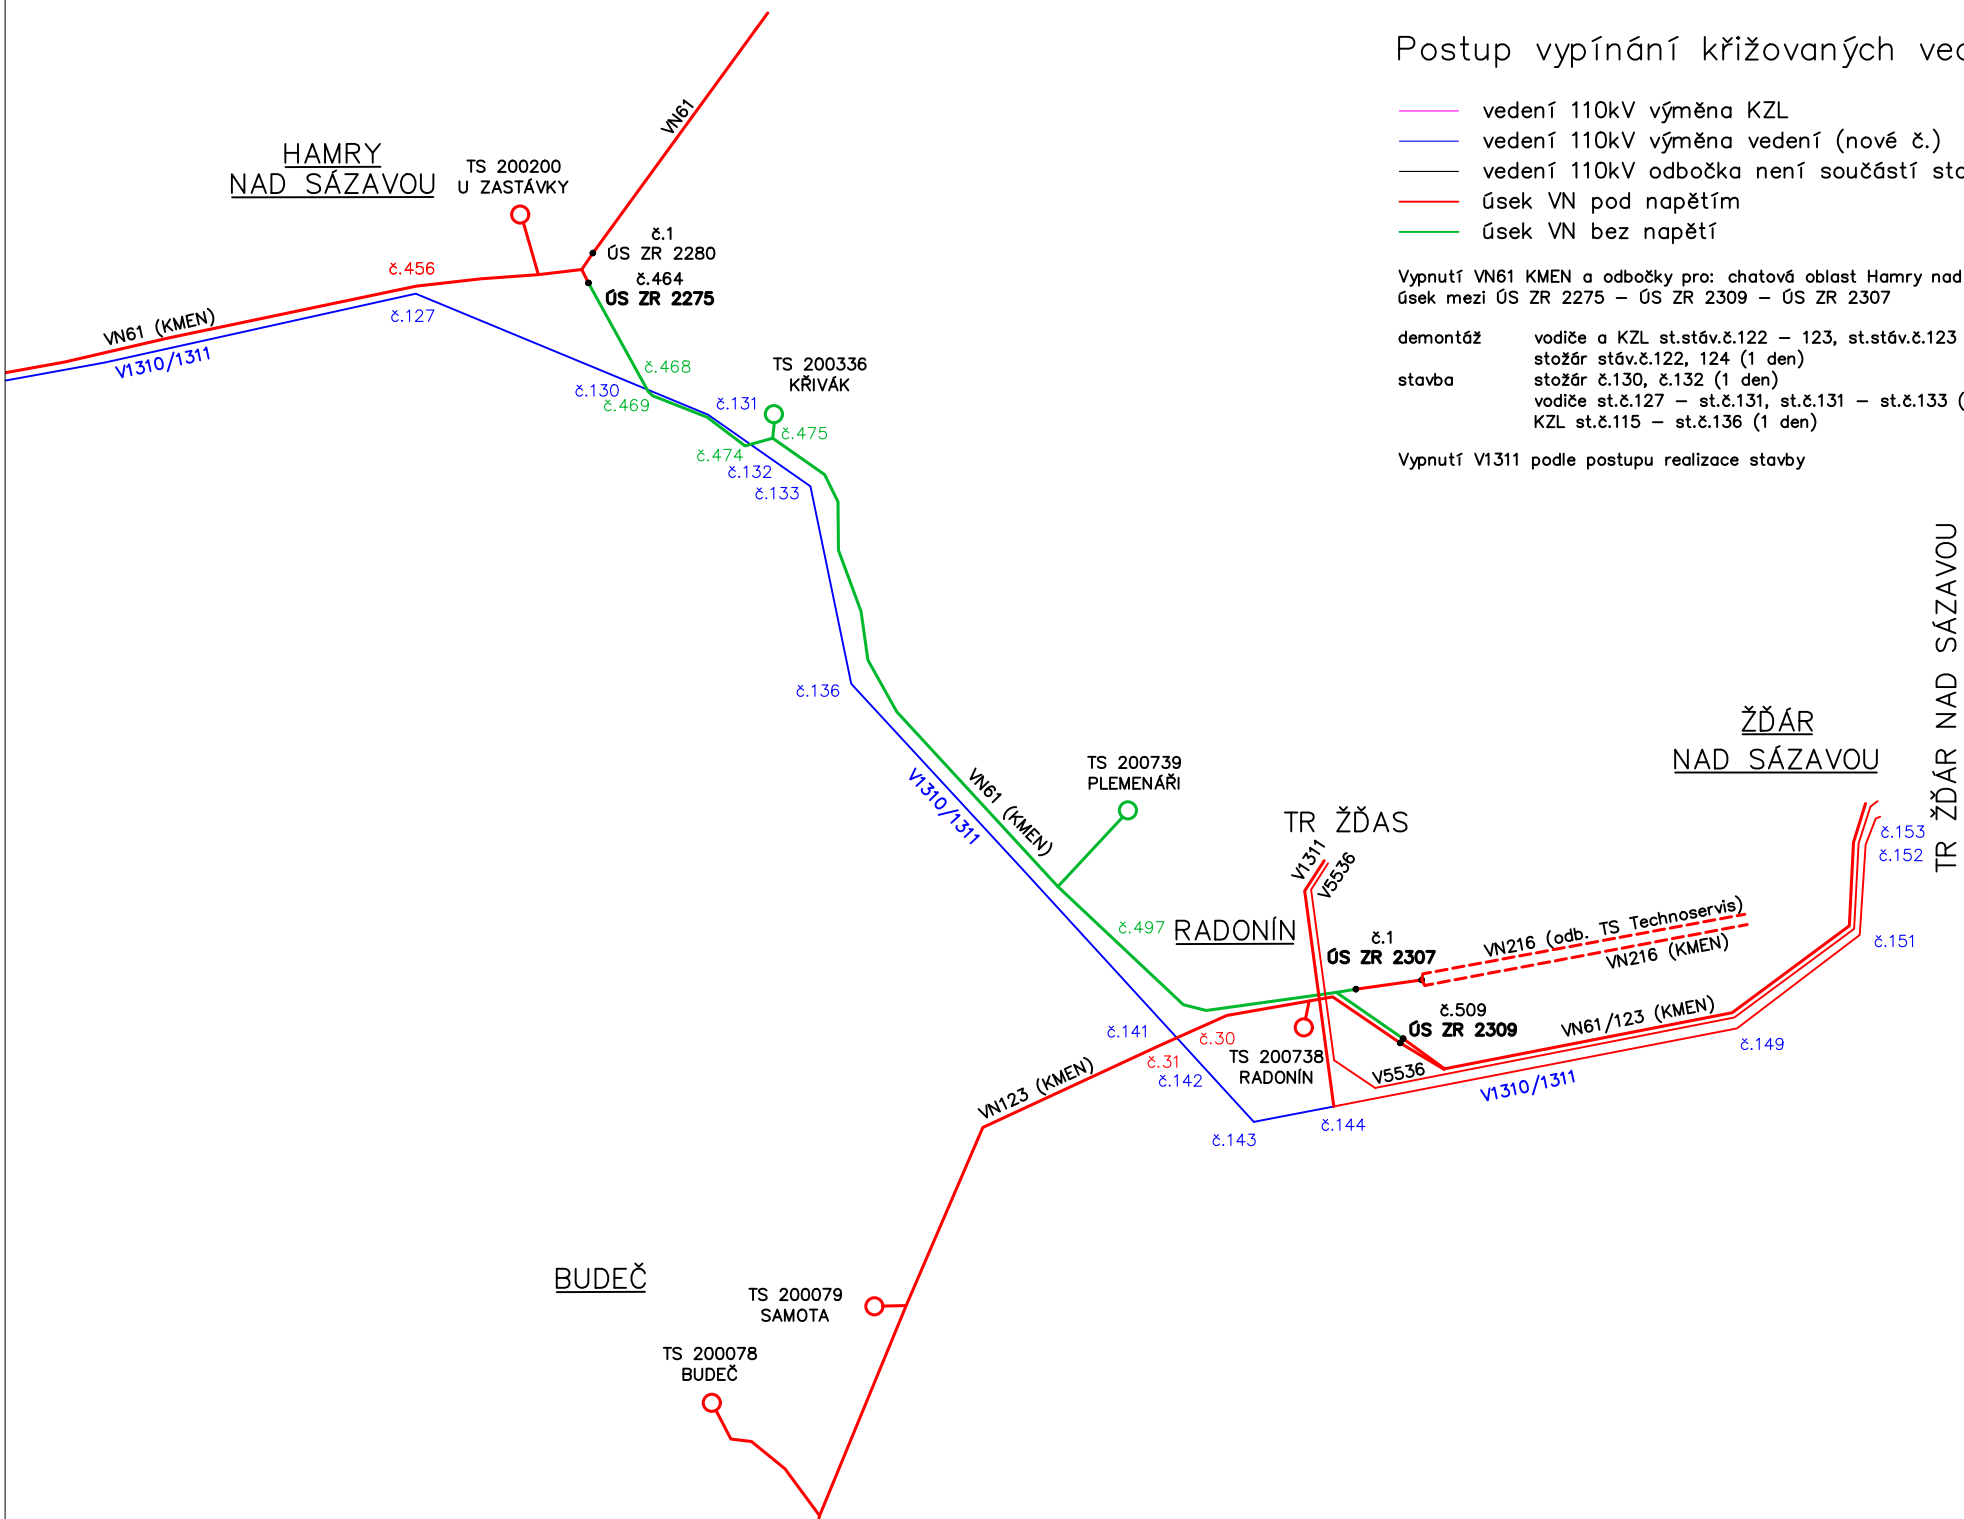



## Postup vypínání křižovaných vedení

- vedení 110kV výměna KZL
- vedení 110kV výměna vedení (nové č.)
- vedení 110kV odbočka není součástí stavby
- úsek VN pod napětím
- úsek VN bez napětí

Vypnutí VN123 KMEN a odbočky pro: obce Radonín, Budeč, nové Veselí  
úsek mezi ÚS ZR 2308 – ÚS ZR 2429

demontáž vodiče a KZL st.stáv.č.134 – st.stáv.135 (1 den)

stavba vodiče st.č.136 – st.č.143 (2 dny)  
KZL st.č.136 – TR Žďár nad Sázavou (1 den)

Vypnutí V1311 v rámci realizace stavby  
Vypnutí V5536 dle požadavku pro manipulaci s jeřábem při demontáži/stavbě stožárů

