ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		**TR Domoradice - modernizace (00102000264C**					
2							
3		**Stavba**	**433 dny**	**01.04. 26**	**26.11. 27**		
4		Předání staveniště	0 dny	01.04. 26	01.04. 26		5;65
5		Zařízení staveniště	2 dny	01.04. 26	02.04. 26	4	69FS+20 dny
6		Vyklizení staveniště	3 dny	24.11. 27	26.11. 27	32;81;72	7
7		Ukončení stavby	0 dny	26.11. 27	26.11. 27	6	
8		Realizace mimo měsíce 11/2026 až 02/2027	85 dny	02.11. 26	26.02. 27	66	43;10;11
9		**PS04 Transformátory, PS06 Tlumivky**	**191 dny**	**01.03. 27**	**22.11. 27**		
10		Odstavení transformace T101	5 dny	01.03. 27	05.03. 27	8	
11		Odpojení TL2, přesun na stanoviště T101, zprovoznění	5 dny	01.03. 27	05.03. 27	8	12
12		Zapnutí T101+ přesunuté TL2	1 den	08.03. 27	08.03. 27	11	13;14
13		Odstavení transformace T102	2 dny	09.03. 27	10.03. 27	12	41SS;25
14		Přesun TL1 na provizorní plochu	2 dny	09.03. 27	10.03. 27	12	34
15		Přesun stroje T102, TL1 a POK na provizorní stání (T103), zprovoznění, spojkování VN kabelů	14 dny	04.05. 27	21.05. 27	37	16
16		Odstavení transformace T101, odvoz stroje T101	2 dny	24.05. 27	25.05. 27	15	28
17		Instalace T101, TL1, technologie. Vyvedení výkonu do R22 kV	14 dny	06.08. 27	25.08. 27	40	18
18		Funkční zkoušky T101 + zprovoznění	3 dny	26.08. 27	30.08. 27	17	19
19		Odstavení T103 + odvoz stroje z Rozvodny	2 dny	31.08. 27	01.09. 27	18	43;20
20		Demontáž stanoviště T103	10 dny	02.09. 27	15.09. 27	19	42
21		Instalace T102, TL2, technologie, zprovoznění. Vyvedení výkonu do R22 kV	14 dny	28.10. 27	16.11. 27	42	22
22		Funkční zkoušky T102	3 dny	17.11. 27	19.11. 27	21	23;31
23		Zapnutí obou výkonových transformátorů	1 den	22.11. 27	22.11. 27	22	
24		**PS09 Rozvodna 110 kV**	**184 dny**	**11.03. 27**	**23.11. 27**		
25		Spojení V1368 a V1370	1 den	11.03. 27	11.03. 27	13	26
26		Demontáž přetahu na T102, HOK	1 den	12.03. 27	12.03. 27	25	35
27		Pole AEA06, přípojnice, FVE	7 dny	13.04. 27	21.04. 27	38	
28		Demontáž portálu (B1-B2) včetně přetahu na T101	2 dny	26.05. 27	27.05. 27	16	39
29		Pole AEA02, přípojnice, FVE	7 dny	06.04. 27	14.04. 27	41	
30		Pole AEA04, přípojnice, FV	7 dny	30.09. 27	08.10. 27	43	
31		Rozpojení V1368 a V1370	1 den	22.11. 27	22.11. 27	22	32
32		Zapnutí celé R110kV	1 den	23.11. 27	23.11. 27	31	6
33		**SO 31 Rozvodna 110 kV - stav. Část**	**167 dny**	**09.03. 27**	**27.10. 27**		
34		Demolice stávajících stání tlumivek	3 dny	11.03. 27	15.03. 27	14	37
35		Demolice patky HOK (B3)	3 dny	15.03. 27	17.03. 27	26	36;70
36		Nový pomocný jímač (J2)	5 dny	18.03. 27	24.03. 27	35	
37		Realizace provizorního stání T103	35 dny	16.03. 27	03.05. 27	34	15;38SS
38		Pole AEA06	20 dny	16.03. 27	12.04. 27	37SS	27
39		Demolice transformátorových stání T101, T102	5 dny	28.05. 27	03.06. 27	28	40;44
40		Nové stání T101, včetně TL1. Základová deska pro T102, TL2	45 dny	04.06. 27	05.08. 27	39	17
41		Pole AEA02 (T101)	20 dny	09.03. 27	05.04. 27	13SS	29
42		Nové stání T102, včetně TL2	30 dny	16.09. 27	27.10. 27	20	21;81FS-3 dny
43		Pole AEA04 (T102)	20 dny	02.09. 27	29.09. 27	19;8	30
44		Kabelovody NN, VN	60 dny	04.06. 27	26.08. 27	39;70	
45		**PS10 Rozvodna 22 kV**	**115 dny**	**08.05. 26**	**15.10. 26**		
46		Vývody Spolí, Nádraží naspojkovat proti sobě	2 dny	08.05. 26	11.05. 26	65;69	47
47		Dovybavení spínače sběren	14 dny	12.05. 26	29.05. 26	46	48SS
48		Zapojení Lira do kobky 26	3 dny	12.05. 26	14.05. 26	47SS	49
49		Velešín, Holoubkov odpojeno	3 dny	15.05. 26	19.05. 26	48	50
50		Vypnutí T101, odpojení	1 den	20.05. 26	20.05. 26	49	51
51		Vypnutí TVS1	1 den	21.05. 26	21.05. 26	50	52
52		Demontáž R22 kV (kobka 21 - 31, systém A1)	5 dny	22.05. 26	28.05. 26	51	74
53		Instalace rozváděčů 22 kV	29 dny	22.07. 26	31.08. 26	74	55;54;60SS;
54		Funkční zkoušky	10 dny	01.09. 26	14.09. 26	53	
55		Zapojení T101 do R22 kV	2 dny	01.09. 26	02.09. 26	53	56
56		Postupné zapojení linek do R22 kV	30 dny	03.09. 26	14.10. 26	55	57;58SS
57		Odpojení T102	1 den	15.10. 26	15.10. 26	56	
58		Zapojení T102 do R22 kV	2 dny	03.09. 26	04.09. 26	56SS	59
59		Přepojení T101 v nové R22 kV (VN kabely)	5 dny	07.09. 26	11.09. 26	58	78
60		PS30 Místní řídicí systém	15 dny	22.07. 26	11.08. 26	53SS	
61		**PS31 Ochrany**	40 dny	22.07. 26	15.09. 26	74	
62		PS32 Dispečerský řídicí systém	20 dny	22.07. 26	18.08. 26	74	
63		PS34 Vysílač a automatiky HDO	20 dny	22.07. 26	18.08. 26	74	
64		**PS50 Vlastní spotřeba**	**153 dny**	**01.04. 26**	**30.10. 26**		
65		Instalace a připojení mobilního záložního zdroje	2 dny	01.04. 26	02.04. 26	4	46
66		TVS1, TVS2. AJB	5 dny	26.10. 26	30.10. 26	75	8
67		PS60 Přenosová zařízení	20 dny	22.07. 26	18.08. 26	74	
68		**SO 11 Vedení 22 kV - kabelové**	**234 dny**	**01.05. 26**	**24.03. 27**		
69		Trasa - vývody 22 kV	5 dny	01.05. 26	07.05. 26	5FS+20 dny	46;80SS;71
70		Provizorní úprava trasy VN kabelu pro A2	5 dny	18.03. 27	24.03. 27	35	44
71		SO 21 Vedení NN - kabelové	10 dny	08.05. 26	21.05. 26	69	
72		SO 37 Veřejné osvětlení	20 dny	25.10. 27	19.11. 27	42FS-3 dny	6
73		**SO 30 Technologické budovy**	**106 dny**	**29.05. 26**	**23.10. 26**		
74		Stav. Úpravy pro rozváděče 22 kV	38 dny	29.05. 26	21.07. 26	52	61;53;84FS+
75		TVS1, TVS2. AJB	34 dny	08.09. 26	23.10. 26	53FS+5 dny	66
76		Elektroinstalace	30 dny	08.09. 26	19.10. 26	74FS+34 dr	
77		ZTI	30 dny	08.09. 26	19.10. 26	74FS+34 dr	79
78		Demontáž R22 kV (kobka 22 - 32, systém A2)	10 dny	14.09. 26	25.09. 26	59	
79		SO 71 Vodovodní přípojka (eletroventil)	2 dny	20.10. 26	21.10. 26	77	
80		SO 27 Optotrubka	10 dny	01.05. 26	14.05. 26	69SS	
81		SO 40 Komunikace místní a účelové	20 dny	25.10. 27	19.11. 27	42FS-3 dny	6
82		SO 37.2 Osvětlení technologických částí rozvoden	20 dny	25.10. 27	19.11. 27	42FS-3 dny	
83		SO 47 Oplocení	5 dny	28.10. 27	03.11. 27	42	
84		SO 55 Vzduchotechnika, klimatizace	30 dny	08.09. 26	19.10. 26	74FS+34 dr	
85		SO 59 Zabezpečovací systémy	30 dny	08.09. 26	21.06. 27	74FS+34 dr	

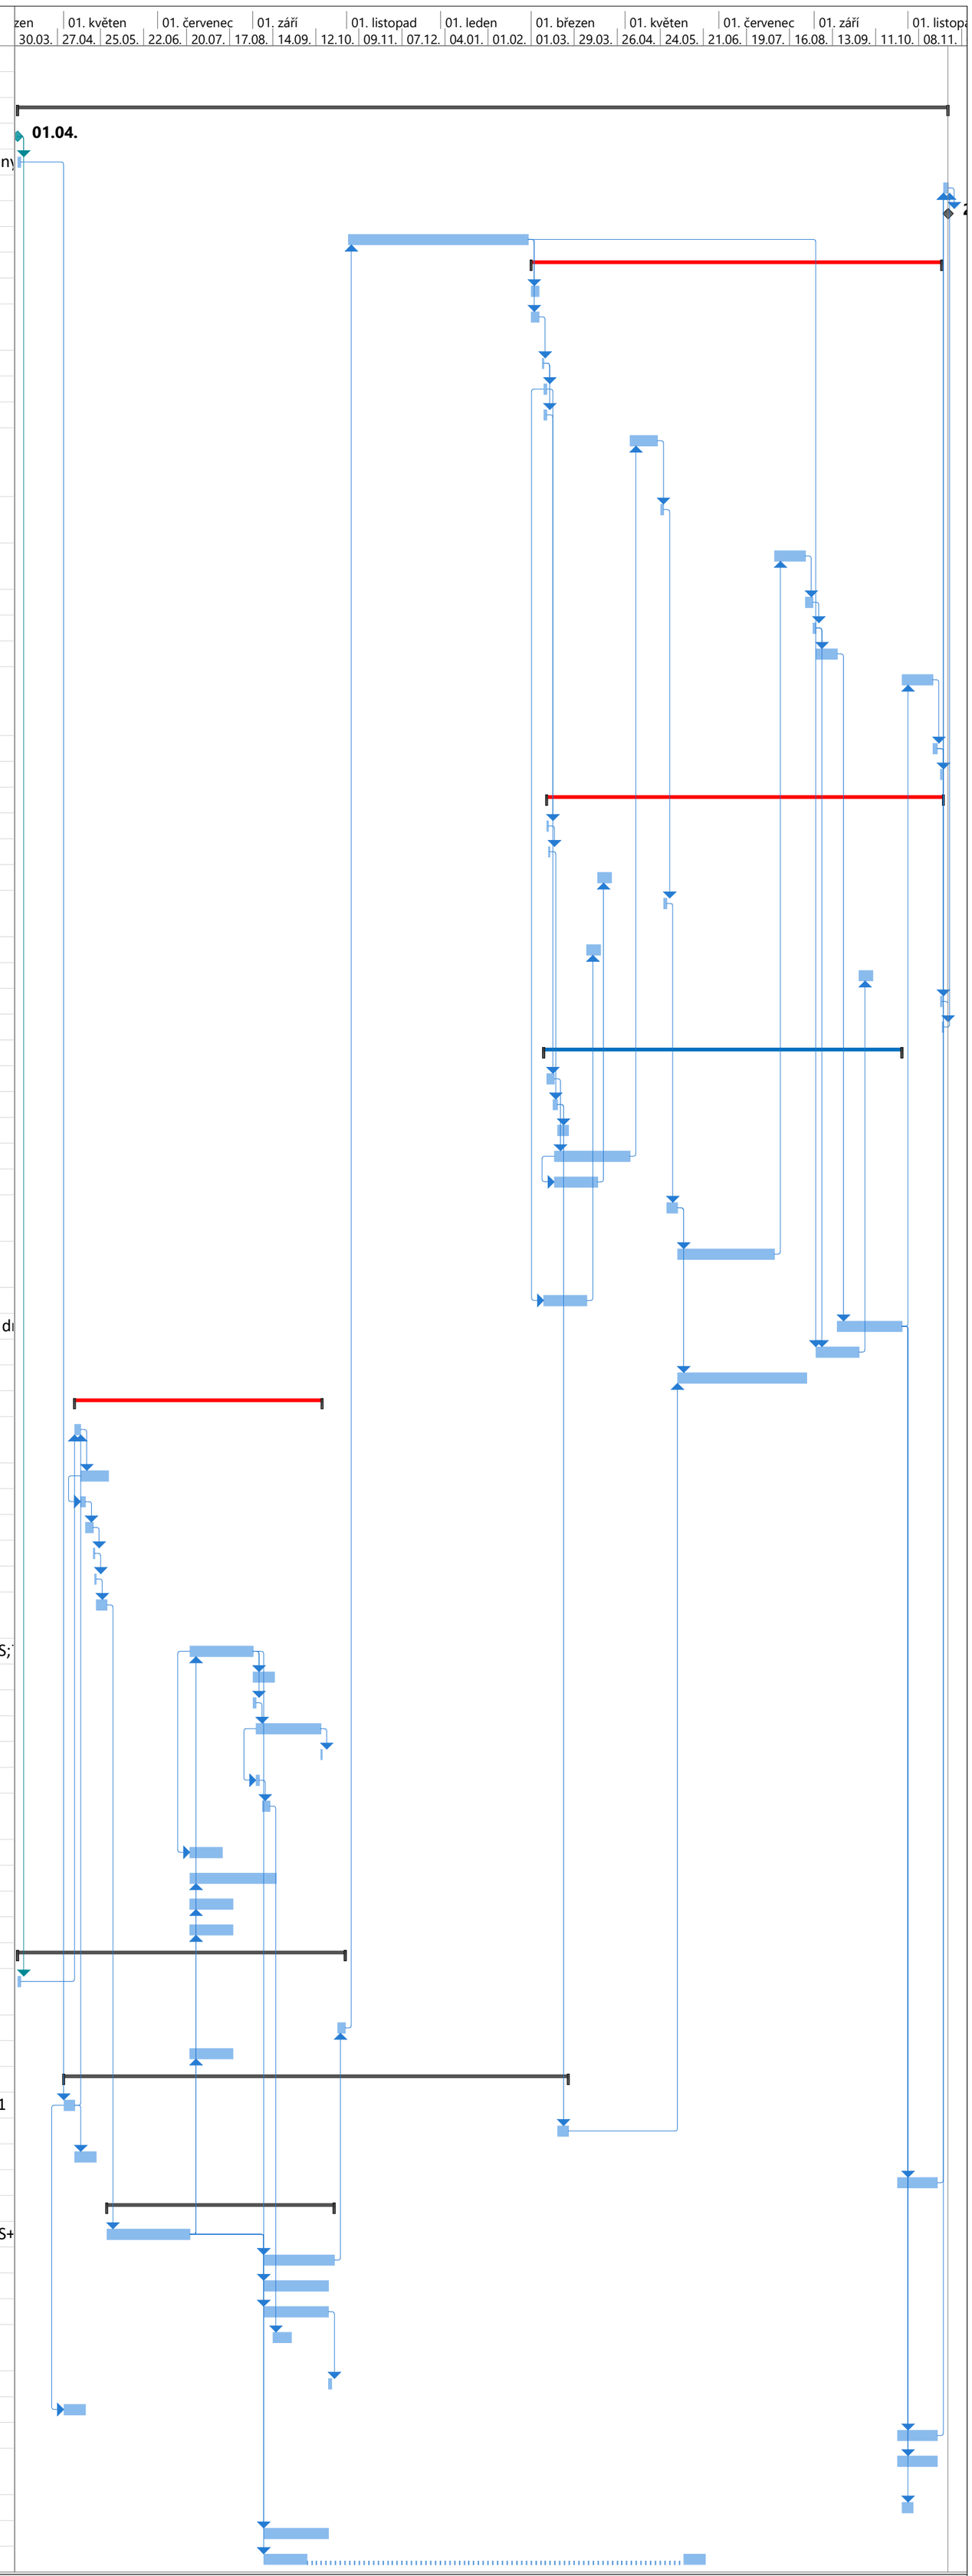

Projekt: TR Domoradice - modernizace
Datum: 25.06. 25

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	

verze 08 z 2025-06-25: Nejdříve je budována R22kV, v následujícím roce celá R110kV; celkem 2 roky; začátek duben 2026; konec listopad 2027
